

Seu sistema, com o funil de vendas da construtora já funcionando em protótipo

Cadastro de empreendimentos, SPEs e unidades · Vendas com repasse Caixa/COHAPAR · Orçado × Realizado

Mais do que um plano: um **protótipo navegável do seu exato escopo**, que você abre agora no navegador e no celular. Funil Reserva → RG → Contrato → Assinado → Repasse, painel por SPE, estoque por empreendimento e a prévia da Fase 2 de custos. As páginas seguintes mostram capturas reais do protótipo e o plano de entrega em duas fases, item a item do seu anúncio.

Sumário

1. O protótipo do seu sistema (teste agora)

p. 2

2. O que cada captura demonstra

p. 3

3. Plano de entrega — Fases 1 e 2, item a item do seu anúncio

p. 4

4. Requisitos técnicos — como vocês pediram

p. 5

5. Marcos e investimento


p. 5

1. O protótipo do seu sistema (teste agora)

Não espere o código para ver o seu sistema. Construí um protótipo interativo com o **funil real de vendas MCMV** — e você pode operá-lo agora, inclusive no celular:

→ <https://devmosaalhaj.github.io/leadlens-poc/construtora-mcmv.html>


Clique em qualquer status na tabela de unidades e o funil avança (Reserva → RG → Contrato → Assinado → Repasse), com KPIs recalculados na hora. É a lógica de negócio que vai para produção, demonstrada antes do contrato.

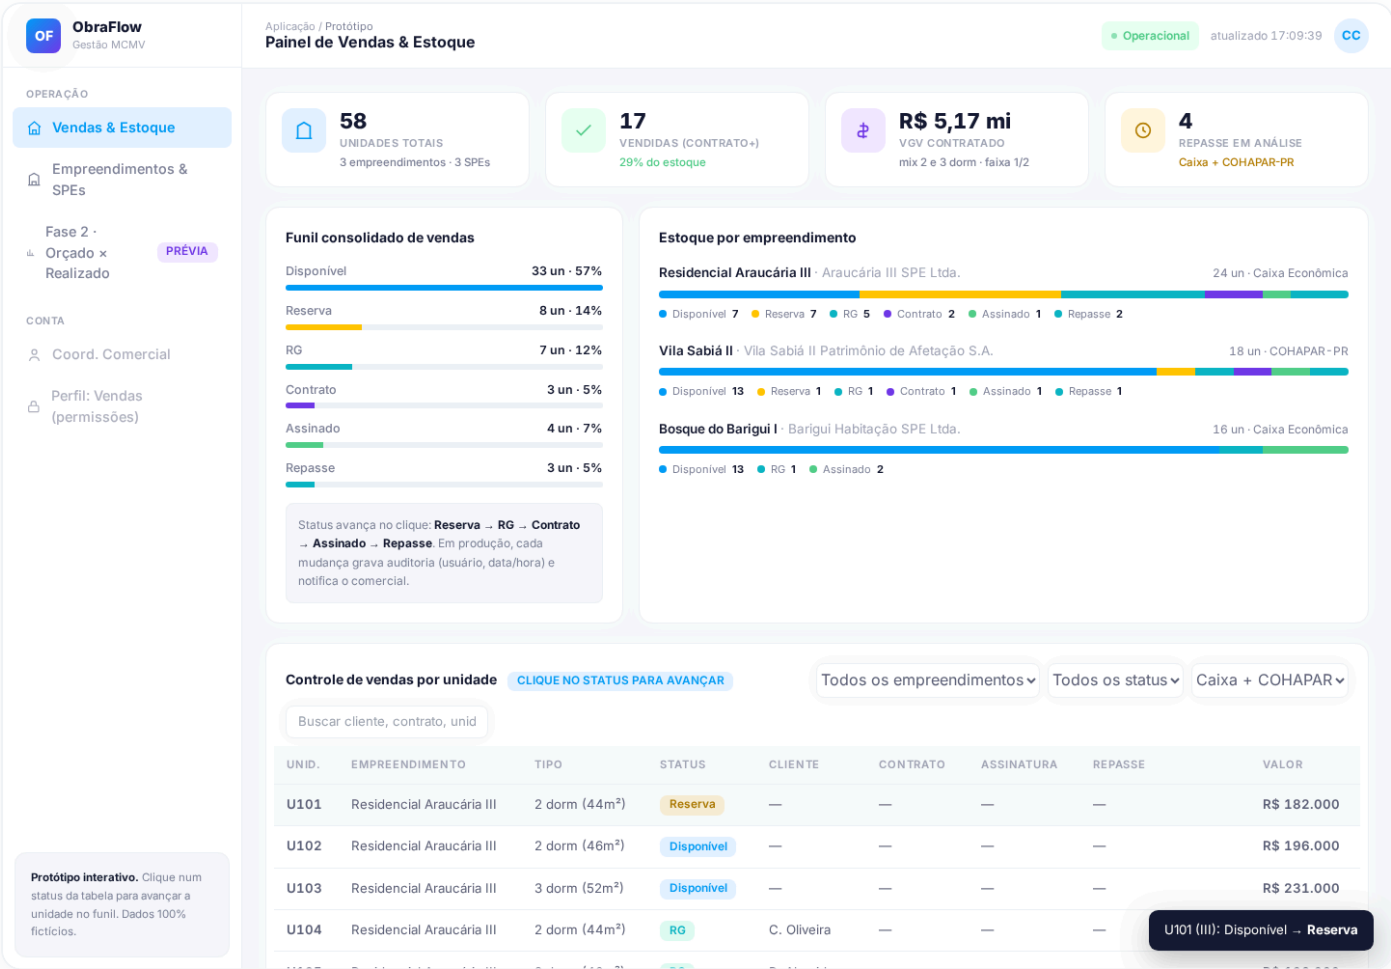

Painel de Vendas: funil consolidado, estoque por empreendimento e controle por unidade (cliente, contrato, assinatura, repasse Caixa/COHAPAR) — captura real do protótipo ao vivo, com uma mudança de status acontecendo.


2. O que cada captura demonstra

Empreendimentos & SPEs com patrimônio de afetação — cada obra no seu CNPJ, com agente financeiro (Caixa ou COHAPAR-PR) e etapa construtiva:

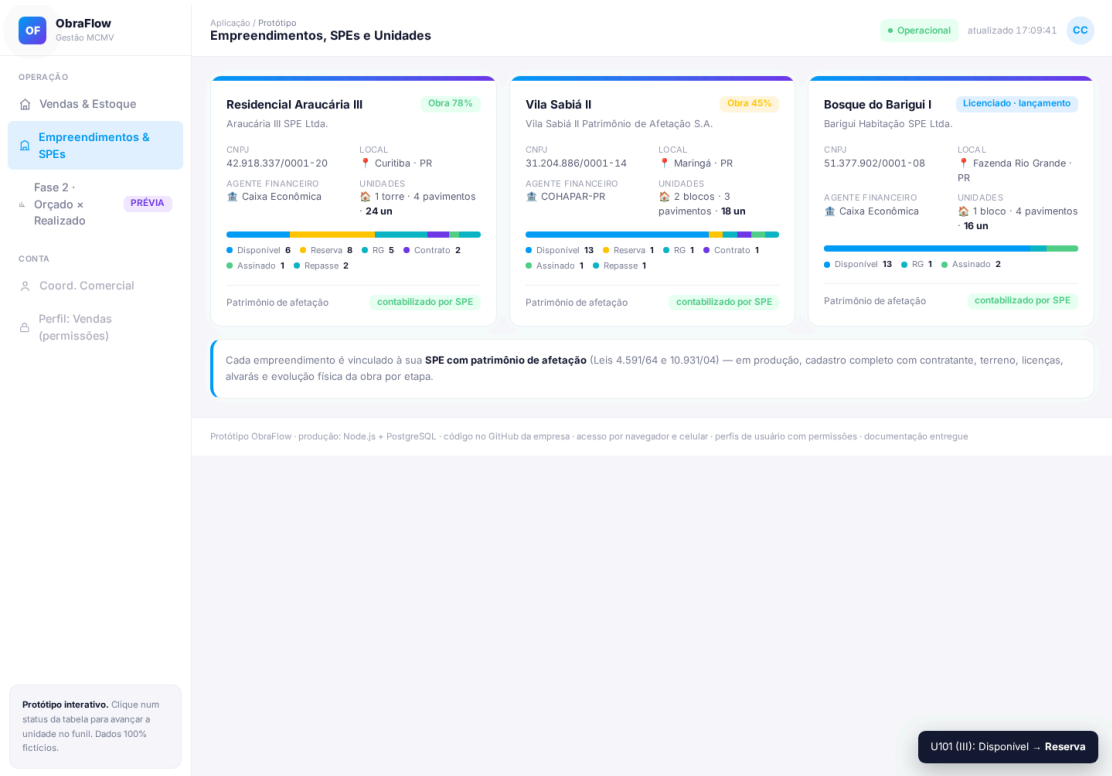

Cada empreendimento vinculado à sua SPE — CNPJ, patrimônio de afetação, agente financeiro e estágio de obra.

Fase 2 — Orçado × Realizado por obra e etapa, com desvios sinalizados por cor (verde = sob controle, amarelo = atenção, vermelho = estourou):

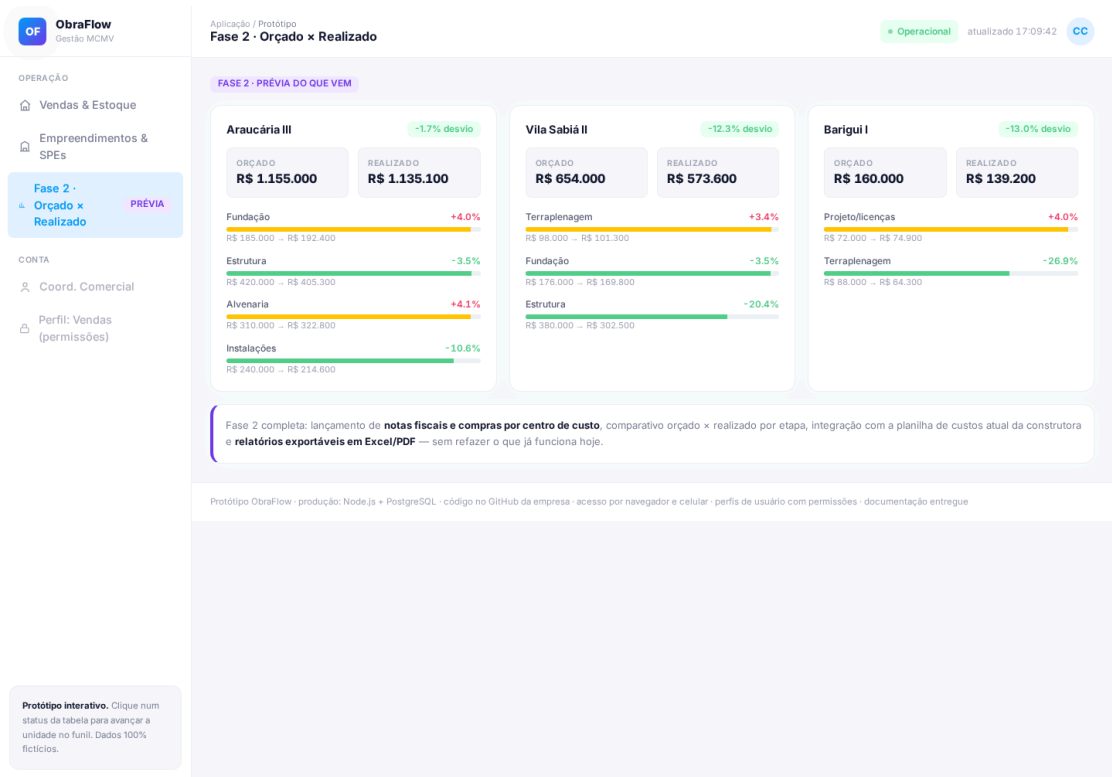

Comparativo por etapa com % de desvio — a prévia do controle de custos da Fase 2.

2.1 No celular do seu comercial

Vocês pediram acesso por navegador e celular — o protótipo já nasce responsivo, com abas de navegação móvel e a mesma lógica de funil:



Mesmo sistema, tela do celular: KPIs, funil e nota de auditoria de status.

3. Plano de entrega — item a item do seu anúncio

Fase 1 · Cadastro de empreendimentos, SPEs e unidades	3 semanas · R\$ 9.800
Fase 1 · Controle de vendas por unidade (cliente, contrato, status de assinatura, repasse Caixa/COHAPAR)	incluído
Fase 1 · Painel de estoque e vendas por empreendimento	incluído
Fase 2 · Orçamento e custo realizado por obra e etapa	3 semanas · R\$ 8.900
Fase 2 · Lançamento de notas e compras por centro de custo	incluído
Fase 2 · Comparativo orçado x realizado + relatórios Excel/PDF	incluído

4. Requisitos técnicos — como vocês pediram

Acesso por navegador e celular	Web responsiva (o protótipo já demonstra)
Perfis de usuário com permissões	Ex.: Comercial vê vendas; Financeiro vê custos/repasses; Diretoria vê tudo
Código-fonte no GitHub da empresa	Entrega contínua no repositório de vocês, com histórico limpo
Hospedagem em conta da empresa	Deploy documentado na infra de vocês (VPS/cloud), sem dependência de mim
Documentação básica	README de instalação, manual do usuário e sessão de handover ao vivo

Stack: Node.js PostgreSQL Web responsiva Testes automatizados GitHub Actions

Vocês pediram preferência por quem usa Claude Code / ferramentas de IA: é assim que este protótipo saiu em horas. Em produção, o mesmo rigor — desenvolvimento assistido por IA, revisado linha a linha, com testes automatizados a cada entrega.

5. Marcos e investimento

R\$ 9.800 Fase 1 — MVP de vendas (3 semanas) 40% no início · 60% na homologação de vocês. Cadastros + vendas + painel, no ar na hospedagem da empresa, com dados reais migrados das planilhas atuais.	R\$ 8.900 Fase 2 — Custos & relatórios (3 semanas) Orçado × realizado por etapa, notas e compras por centro de custo, relatórios Excel/PDF exportáveis.
---	---

Total: **R\$ 18.700** — dentro da faixa "mais de R\$ 16.000" do seu anúncio, sem surpresa. A Fase 2 só inicia após a aprovação da Fase 1. **60 dias de garantia de correções** após cada entrega. Prazos contam a partir do acesso às planilhas atuais.

Cronograma:

Fase 1 · Semanas 1–2	Setup do ambiente no GitHub/hospedagem de vocês + cadastros (empreendimentos, SPEs, unidades) + migração das planilhas atuais
Fase 1 · Semana 3	Controle de vendas completo + painel de estoque + homologação com usuários reais
Fase 2 · Semanas 1–3	Custos por etapa + notas/compras por centro de custo + orçado × realizado + relatórios Excel/PDF + handover documentado

Portfólio de sistemas em produção

- **Reachware Studio (arquiteto):** iPaaS que roda milhares de integrações diárias (ERP, e-commerce, CRM) em produção — a disciplina de exatidão que gestão de repasse exige
- **Para o domínio de vocês:** o protótipo navegável desta proposta é a demonstração direta — construído em horas com desenvolvimento assistido por IA (Claude Code) e revisão linha a linha
- **Sem caixa-preta:** código de vocês, hospedagem de vocês, documentação e handover ao vivo

Uma pergunta para calibrar o MVP: **quantas obras simultâneas e quantos usuários** o sistema terá no primeiro ano?

Mosa Ahmad

Senior Integration Engineer & iPaaS Architect

Pagamento via escrow Workana · 40/60 por fase
